

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 관리번호 | 3-1 | 공약명 | 자전거 도로 정비를 통한 친환경적 교통체계 구축 | | | | |
| 추진부서 | 건설과 과장 구성호 / 현장보수팀장 김종록 / 주무관 김선종(☎665-2918) | | | | | | |
| 추진상황 | 진도율 (%) | 추진완료 | | 추진중 | | 미추진 | 보류 |
| | | 종 결 | 지속추진 | 정상 | 일부추진 | | |
| | 100 | ○ | | | | | |

□ 사업목표

- 강북지역과 금호강 자전거 도로와의 단절 구간에 자전거 전용도로를 설치하여 시민들에게 안전한 도로·교통환경 제공

| 최종목표 | 연도 | 목 표 |
|----------------|-------|--------------------------|
| 자전거 전용도로 설치 | 2018년 | · 공사 착공 및 대구환경공단 부지사용 협의 |
| | 2019년 | · 공사준공 |
| | 2020년 | |
| | 2021년 | |
| | 2022년 | |

□ 사업개요

- 위 치 : 무태네거리~산격대교(서변동 1801번지 인근)
- 기 간 : 2018. 4. ~ 2018. 11.
- 개 요 : 자전거도로 L=401m, B=1.5~3m (아스팔트 317m, 데크 84m)
- 사업비 : 400백만원

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총 사업비 | | | | | 확보액 | | | | | 집행액 | | | | |
|----|-------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|
| | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 |
| 당초 | 400 | 200 | 200 | - | - | 400 | 200 | 200 | - | - | 400 | 200 | 200 | - | - |
| 현재 | 400 | 200 | 200 | - | - | | | | | | | | | | |

□ 추진실적

| 일 자 | 추진내용 |
|--------------|---------------------|
| 2018. 4. 23. | · 공사착공 |
| 2018. 7. | · 대구환경공단 부지 사용 협의완료 |
| 2018. 11. 8. | · 공사준공 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|------------|---------------------|-----|------|-----|----|
| 관리번호 | 3-2-1 | 공약명 | 복현동 주거환경개선사업 | | | | |
| 추진부서 | 건축주택과 과장 신한중 / 주거정비팀장 성장경 / 주무관 이성규(☎665-2954) | | | | | | |
| 추진상황 | 진도율 (%) | 추진완료 | | 추진중 | | 미추진 | 보류 |
| | | 종 결 | 지속추진 | 정상 | 일부추진 | | |
| | 36 | | | ○ | | | |

□ 사업목표

- 복현동 주거환경개선사업 완료

| 최종목표 | 연도 | 목 표 |
|------|-------|--------------|
| 사업완료 | 2018년 | · 정비구역 지정 |
| | 2019년 | · 사업시행계획인가 |
| | 2020년 | · 보상, 이주, 철거 |
| | 2021년 | · 착공 |
| | 2022년 | · 골조공사 |

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 12. ~ 2025. 2.
- 위 치 : 복현동 617-8번지 일원(구역면적 12,455㎡)
- 사업규모 : 아파트 4개동 278세대 및 부대복리시설, 주민공동시설
- 시 행 자 : 대구도시공사

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

| 총 사업비 | | | | | | 확보액 | | | | | 집행액 | | | | |
|-------|--------|--------|----|----|--------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 구분 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 |
| 당초 | 58,812 | 15,116 | 91 | 39 | 43,566 | 130 | - | 91 | 39 | - | 130 | - | 91 | 39 | - |
| 현재 | 58,812 | 15,116 | 91 | 39 | 43,566 | | | | | | | | | | |

□ 추진실적

| 일 자 | 추진내용 |
|---------------|---------------------|
| 2018. 12. 10. | · 정비구역 지정 |
| 2018. 12. 13. | · 사업시행자 지정 (대구도시공사) |
| 2019. 6. 25. | · 설계용역 선정 |
| 2020. 6. 29. | · 사업시행계획인가 |
| 2021. 4. 28. | · 감정평가실시 |
| 2021. 10. 8. | · 재결신청서 열람·공고 |

□ 향후계획

- 2023. 1. : 착공
- 2025. 2. : 준공



| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 관리번호 | 3-2-2 | 공약명 | 고성동 주택재건축사업 | | | | |
| 추진부서 | 건축주택과 과장 신한중 / 주거정비팀장 성장경 (☎665-2953) | | | | | | |
| 추진상황 | 진도율 (%) | 추진완료 | | 추진중 | | 미추진 | 보류 |
| | | 종 결 | 지속추진 | 정상 | 일부추진 | | |
| | 100 | ○ | | | | | |

□ 사업목표

- 고성 주택재건축사업 완료

| 최종목표 | 연도 | 목 표 |
|-------|-------|-------------------|
| 사업 완료 | 2018년 | · 지하층 및 골조공사(30%) |
| | 2019년 | · 공사 추진(85%) |
| | 2020년 | · 준공(2020년 5월) |

□ 사업개요

- 사업위치 : 고성동3가 5-139일원(고성광명아파트)
- 사업규모 : 아파트 9개동(682세대), 지하2층/지상29층, 연면적 102,726㎡
- 추진기간 : 2006년 6월 ~ 2020년 5월

□ 사업예산 : 해당없음(민간사업 추진)

□ 추진실적

| 일 자 | 추 진 내 용 |
|--------------|--------------|
| 2006. 6. 28. | · 추진위원회 승인 |
| 2007. 1. 30. | · 정비구역 지정 |
| 2007. 4. 24. | · 조합설립 인가 |
| 2007. 8. 10. | · 사업계획시행 인가 |
| 2016. 8. 30. | · 관리처분계획 인가 |
| 2017. 9. 13. | · 착공 |
| 2017. 9. 14. | · 입주자모집공고 승인 |
| 2020. 5. 15. | · 준공 |

위치도



현장사진



| | | | | | | | |
|-------------|---|------------|----------------------------|-----|------|-----|----|
| 관리번호 | 3-3 | 공약명 | 대전 화물자동차 공영차고지 조성사업 | | | | |
| 추진부서 | 교통과 과장 서송학 / 교통시설팀장 정광수 / 주무관 손용우(☎665-3163) 운수관리팀장 최지영 / 주무관 김은정(☎665-3046) | | | | | | |
| 추진상황 | 진도율 (%) | 추진완료 | | 추진중 | | 미추진 | 보류 |
| | | 종 결 | 지속추진 | 정상 | 일부추진 | | |
| | 40 | | | ○ | | | |

□ 사업목표

- 영세 화물운송업자의 차고지 부족난 해소
- 지역 화물 물동량의 원활한 수송으로 물류경쟁력의 강화
- 도로 및 주거 지역 내 불법 주차 완화로 쾌적한 주거환경 조성

| 최종목표 | 연도 | 목 표 |
|----------------------|-------|--------------------------------|
| 화물자동차 공영차고지 조성 | 2018년 | · 중기지방재정계획 반영 및 국비 확보 |
| | 2019년 | · 관리계획 변경, 기본 및 실시계획 용역 |
| | 2020년 | · GB관리계획 변경 |
| | 2021년 | · 도시계획시설 결정 |
| | 2022년 | · 실시계획 인가고시 및 토지 보상 · 공사 시행 |

□ 사업개요

- 위치/면적 : 대전동 43번지 일원 / 33,588㎡정도
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년)
- 주요시설 : 주차면 480면, 관리동, 자주식 철골 주차장 등
- 총사업비 : 410억원(국비 4, 시비 365, 구비 41)

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비 | | | | | 확보액(2021년 기준) | | | | | 집행액 | | | | |
|----|--------|--------|--------|-------|----|---------------|-----|--------|-------|----|-----|-----|-----|-----|----|
| | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 |
| 당초 | 30,000 | 21,000 | 6,000 | 3,000 | - | 11,777 | 400 | 10,215 | 1,162 | - | 866 | 400 | 338 | 128 | - |
| 현재 | 41,000 | 400 | 36,500 | 4,100 | - | | | | | | | | | | |


※ 2022년 본예산 편성 시 시비 8,000백만원/ 구비 1,828백만원 확보

□ 추진실적

| 일 자 | 추진내용 |
|-----------------|---|
| 2018. 8. | · 국비(지역발전특별회계) 확보 |
| 2019. 4. | · 화물자동차 공영차고지 조성사업 관련 용역 착수 |
| 2019. 7. | · 대구시 입지대상시설 자체심사 |
| 2019. 8. | · 국토부 입지대상시설 중앙심사 |
| 2019. 11. | · 대구시 도시계획위원회 심의 |
| 2020. 1. ~ 2. | · 중앙관계기관 협의(국토교통부↔국방부 외 6기관) |
| 2020. 9. | · 제21회 중앙도시계획위원회 심의(GB관리계획 변경) |
| 2020. 11. | · 제23회 중앙도시계획위원회 재심의(GB관리계획 변경) - 원안가결 · GB관리계획 변경 승인 통보 |
| 2020. 11. ~ 12. | · GB관리계획 변경 승인 열람공고 |
| 2021. 1. ~ 3. | · 도시계획시설 결정(안) 관련부서 협의 |
| 2021. 4. ~ 5. | · 도시관리계획(안) 열람공고 |
| 2021. 6. | · 대구광역시 도시계획위원회 심의(도시계획시설 결정) - 원안가결 · 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시 |
| 2021. 7. | · 확보예산 교부 및 토지 등 보상추진 계획 수립 |
| 2021. 8. | · 지방재정 중앙투자심사 결과(조건부가결) |
| 2021. 8. ~ 9. | · 토지 및 지장물 등 물건조사 용역 추진 |
| 2021. 10. | · 토지 및 지장물 등 물건조사 보상물건 확정 |
| 2021. 12. | · 감정평가 선정 및 감정평가 실시 |

□ 향후계획

- 2022년 1월 ~ : 토지 보상 및 실시계획 인가고시
- 2022년 10월~ : 공사 착공
- 2023년 : 공사 준공
- 설계도

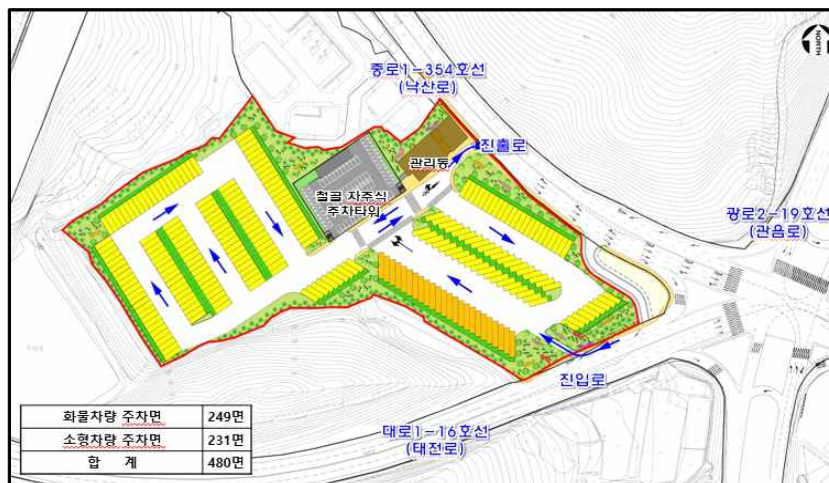

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|--------------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 관리번호 | 3-4-1 | 공약명 | 사회 재난 선제적 대응체계 구축 | | | | |
| 추진부서 | 안전총괄과 윤정구 / 사회재난팀장 홍영미 / 주무관 홍헌섭(☎665-2893) | | | | | | |
| 추진상황 | 진도율 (%) | 추진완료 | | 추진중 | | 미추진 | 보류 |
| | | 종 결 | 지속추진 | 정상 | 일부추진 | | |
| | 100 | ○ | | | | | |

□ 사업목표

- 구 특성에 맞는 현장대응체계 표준 프레임 마련
- 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 보완
- 매뉴얼·가이드라인 교육 및 현장적용 시뮬레이션

| 최종목표 | 연도 | 목 표 |
|----------------------------|-------|------------------------------|
| 재난현장 표준화 매뉴얼 및 가이드라인 제작 완료 | 2018년 | · 재난현장 표준화 매뉴얼 및 가이드라인 제작 완료 |
| | 2019년 | |
| | 2020년 | |
| | 2021년 | |
| | 2022년 | |

□ 사업개요

- 근 거
 - 「재난 및 안전관리 기본법」 제34조의5(재난분야 위기관리 매뉴얼 작성·운용)
 - 재난현장 대응 표준화 시범사업을 위한 특별교부세 지원
 - ※ 2017년 재난현장 대응 표준화 시범사업 대상자 선정(행정안전부)
- 기 간 : 2017. 10. ~ 2018. 11.
- 사 업 비 : 200,000천원(시 보조금 100%)
- 계약방법 : 조달의뢰(학술연구용역)

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총 사업비 | | | | | 확보액 | | | | | 집행액 | | | | |
|----|-------|----|-----|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|----|-----|----|----|
| | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 |
| 당초 | 200 | - | 200 | - | - | 200 | - | 200 | - | - | 121 | - | 121 | - | - |
| 현재 | 200 | - | 200 | - | - | | | | | | | | | | |

□ 추진실적

| 일 자 | 추진내용 |
|---------------|---------------------------------------|
| 2017. 05. 04. | · 재난현장 대응 표준화 시범사업 대상자 선정 |
| 2017. 10. 04. | · 재난현장 대응 표준화 시범사업 보조금 교부 |
| 2018. 02. 04. | · 일상감사 요청 |
| 2018. 02. 27. | · 계약심사 요청 |
| 2018. 03. 15. | · 용역입찰 의뢰 |
| 2018. 05. 21. | · 용역계약 → (주) 부린 |
| 2018. 05. 31. | · 연구용역 착수보고회 실시 |
| 2018. 07. 12. | · 현장 조치 매뉴얼 부서별 담당자 교육 |
| 2018. 10. 02. | · 연구용역 중간보고회 |
| 2018. 11. 30. | · 연구용역 최종보고회 |
| 2018. 11. 30. | · 현장조치 행동매뉴얼 제작 완료 |
| 2018. 12. 17. | · 행정안전부 현장조치 행동매뉴얼 우수사례 경진대회서 우수기관 선정 |

□ 향후계획

- 변화되는 환경에 맞춘 지속적인 현행화를 통해 현장적응성 유지

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 관리번호 | 3-4-2 | 공약명 | 자연재난 선제적 대응체계 구축 | | | | |
| 추진부서 | 안전총괄과 윤정구 / 자연재난팀장 방효석 / 주무관 김문학(☎665-4354) | | | | | | |
| 추진상황 | 진도율 (%) | 추진완료 | | 추진중 | | 미추진 | 보류 |
| | | 종 결 | 지속추진 | 정상 | 일부추진 | | |
| | 100 | | ○ | | | | |

□ 사업목표

- 각종 자연 재난에 신속히 대응할 수 있도록 관련 매뉴얼을 현행화하고 정비
- 매년 폭염피해가 증가하는 추세로 이에 대비한 홍보 및 대응활동
- 최근 지진에 대한 주민들의 관심을 반영하여 지진 대응체계 구축

| 최종목표 | 연도 | 목 표 |
|------------------|-------|--|
| 자연재난 선제적 대응체계 구축 | 2018년 | · 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비(매년), · 폭염 대응 체계 구축(매년) · 지진 대응 체계 구축(내진성능평가, 지진대응패키지) |
| | 2019년 | · 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비(매년), · 폭염 대응 체계 구축(매년) |
| | 2020년 | · 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비(매년), · 폭염 대응 체계 구축(매년) |
| | 2021년 | · 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비(매년), · 폭염 대응 체계 구축(매년) |
| | 2022년 | · 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비(매년), · 폭염 대응 체계 구축(매년) |

□ 사업개요

- 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비 및 배부(매년)
 - 폭염 대응체계 구축(매년)
 - 폭염대책기간 : 매년 5월 ~ 9월
 - 그늘막(63개소)운영 및 관리, 재난도우미(299명)지정
 - 주요간선도로(50km)살수
 - 야외 무더위쉼터 운영(공원, 교량하부)
- ※ 코로나19 장기화에 따라 실내 무더위쉼터(133개소)는 임시 휴관

○ 지진 대응체계 구축(2019년~2021년)

- 2019년~2020년 : 공공시설물 내진성능평가(13개소)
- 2021년 : 공공시설물 3개소 보수보강공사 완료, 1개소 실시설계 완료

□ 사업예산(지진 대응체계 구축)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총 사업비 | | | | | 확보액 | | | | | 집행액 | | | | |
|----|-------|-----|----|-------|----|-------|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|
| | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 |
| 당초 | 1,836 | 900 | | 1,436 | | 1,836 | 900 | | 936 | | 700 | 900 | | 234 | 66 |
| 현재 | 1,836 | 900 | | 936 | | | | | | | | | | | |

□ 추진실적

| 일 자 | 추진내용 |
|------------|-------------------------------------|
| 2019. 5월 | · 그늘막 구입 설치(6개소) |
| 2019. 6월 | · 자연재난 표준행동 매뉴얼 제작 |
| 2019. 6~9월 | · 폭염대응 주요간선도로 살수차 임차용역 |
| 2019. 8월 | · 찜질방 활용 무더위쉼터 운영(강북, 강남 각 1개소) |
| 2019. 12월 | · 공공시설물 2개소(칠곡시장, 창업보육센터) 내진성능평가 완료 |
| 2020. 1월 | · 공공시설물 11개소(경로당) 내진성능평가 완료 |
| 2020. 5~6월 | · 그늘막 구입 설치(13개소) |
| 2020. 6월 | · 자연재난 표준행동 매뉴얼 제작 |
| 2020. 6~9월 | · 폭염대응 주요간선도로 살수차 임차용역 |
| 2020. 7~8월 | · 그늘막 구입 설치(5개소) |
| 2020. 8월 | · 야외 무더위 쉼터 운영 및 양산 배부사업 시행 |
| 2021. 4월 | · 무태교 보수보강공사 완료 |
| 2021. 5~6월 | · 그늘막 구입 설치(7개소) |
| 2021. 6월 | · 하천출입차단기 징검다리 10개소 설치 |
| 2021. 6~9월 | · 폭염대응 주요간선도로 살수차 임차용역 |
| 2021. 6월 | · 침산2동 행정복지센터 외 1개소 내진보강 완료 |
| 2021. 6월 | · 태전2동 행정복지센터 내진보강 실시설계 완료 |

□ 향후계획

- 폭염대책기간 중 신속한 장비 확보 및 인력동원
- 폭염 대비 양산 배부 및 대여사업(2021년)
- 그늘막 추가설치 및 하천출입차단기 추가설치
- 공공시설물 내진보강공사 지속 추진

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 코로나19 장기화로 인한 경로당 등 기존 실내 무더위쉼터 운영이 어려움
- 대책
 - 기존 무더위쉼터 임시 휴관 및 야외 무더위쉼터(공원, 교량 하부 등) 적극 운영

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 관리번호 | 3-5 | 공약명 | 교통약자 보행환경 개선사업 | | | | |
| 추진부서 | 교통과 과장 서송학 / 교통시설팀장 정광수 / 주무관 최승완(☎665-3161) | | | | | | |
| 추진상황 | 진도율 (%) | 추진완료 | | 추진중 | | 미추진 | 보류 |
| | | 종 결 | 지속추진 | 정상 | 일부추진 | | |
| | 100 | | ○ | | | | |

□ 사업목표

- 대각선 횡단보도 및 고원식 횡단보도 설치
- 생활권 이면도로 교통환경 개선
- 횡단보도 집중조명(투광기) 설치

| 최종목표 | 연도 | 목 표 |
|--------------------|-------|---|
| 교통약자 보행환경 개선 | 2018년 | · 고원식 9개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 29개소 |
| | 2019년 | · 고원식 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 5개소 (고원식 7개소, 집중조명 76개소 확대 시행) |
| | 2020년 | · 고원식 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 5개소 (집중조명 29개소 확대시행) |
| | 2021년 | · 고원식 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 5개소 |
| | 2022년 | · 고원식 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 5개소 |

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 720백만원
- 사업내용
 - 대각선 횡단보도 설치 : 7개소
 - 고원식 횡단보도 설치 : 40개소
 - 생활권 이면도로 정비 : 5개 지역
 - 횡단보도 집중조명 설치 : 40개소

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

| 구분 | 총사업비 | | | | | 확보액 | | | | | 집행액 | | | | |
|----|-------|----|-------|----|----|-------|----|-------|----|----|-------|----|-------|----|----|
| | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 |
| 당초 | 720 | - | 720 | - | - | 1,199 | - | 1,199 | - | - | 1,199 | - | 1,199 | 20 | - |
| 현재 | 1,219 | - | 1,199 | 20 | - | 1,199 | - | 1,199 | - | - | 1,199 | - | 1,199 | 20 | - |

□ 추진실적

| 일 자 | 추진내용 |
|----------------|---|
| 2018. 7. | · 횡단보도 집중조명 설치 29개소 |
| 2018. 8. | · 생활권 이면도로 정비 1개 지역 정비 · 고원식 횡단보도 9개소 설치 |
| 2018. 9. | · 대각선 횡단보도 2개소 설치 |
| 2019. 7. | · 횡단보도 집중조명 41개소 설치 · 대각선 횡단보도 1개소 설치 |
| 2019. 8. | · 고원식 횡단보도 7개소 설치 |
| 2019. 12. | · 횡단보도 집중조명 35개소 설치 · 대각선 횡단보도 2개소 설치 |
| 2020. 6. | · 횡단보도 집중조명 29개소 설치 |
| 2020. 7. | · 고원식 횡단보도 5개소 설치 시행 |
| 2021. 6. | · 고원식 횡단보도 3개소 설치 시행 |
| 2021. 7. | · 횡단보도 집중조명 13개소 설치 |
| 2021. 8. | · 생활권 이면도로 정비 1개 지역 |
| 2021. 9. ~ 12. | · 고원식횡단보도 8개소 설치 |

□ 향후계획

- 고원식 횡단보도 및 횡단보도 집중조명장치, 대각선 횡단보도 추진
- 노후된 안전시설에 대한 유지보수 지속 추진
