

관리번호	3-1	공약명	자전거 도로 정비를 통한 친환경적 교통체계 구축				
추진부서	건설과 과장 전진기 / 현장보수팀장 이상운 / 주무관 김선종(☎665-2918)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ 사업목표

- 강북지역과 금호강 자전거 도로와의 단절 구간에 자전거 전용도로를 설치하여 시민들에게 안전한 도로·교통환경 제공

최종목표	연도	목 표
자전거 전용도로 설치	2018년	· 공사 착공 및 대구환경공단 부지사용 협의
	2019년	· 공사준공
	2020년	
	2021년	
	2022년	

□ 사업개요

- 위 치 : 무태네거리~산격대교(서변동 1801번지 인근)
- 기 간 : 2018. 04. ~ 2018. 11.
- 개 요 : 자전거도로 L=401m, B=1.5~3m (아스팔트 317m, 데크 84m)
- 사업비 : 400백만원

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	400	200	200	-	-	400	200	200	-	-	400	200	200	-	-
현재	400	200	200	-	-	400	200	200	-	-	400	200	200	-	-

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 04. 23.	· 공사착공
2018. 07.	· 대구환경공단 부지 사용 협의완료
2018. 11. 08.	· 공사준공

관리번호	3-2-1	공약명	복현동 주거환경개선사업				
추진부서	건축주택과 과장 신한중 / 주거정비팀장 성장경 / 주무관 이성규(☎665-2954)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	30			○			

□ 사업목표

- 복현동 주거환경개선사업 완료

최종목표	연도	목 표
사업완료	2018년	· 정비구역 지정
	2019년	· 사업시행계획인가
	2020년	· 보상, 이주, 철거
	2021년	· 착공
	2022년	· 골조공사

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 12. ~ 2025. 2.
- 위 치 : 복현동 617-8번지 일원(구역면적 12,455㎡)
- 사업규모 : 아파트 4개동 278세대 및 부대복리시설, 주민공동시설
- 시 행 자 : 대구도시공사

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	58,812	15,116	91	39	43,566	130	-	91	39	-	130	-	91	39	-
현재	58,812	15,116	91	39	43,566										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 12. 10.	· 정비구역 지정
2018. 12. 13.	· 사업시행자 지정 (대구도시공사)
2019. 06. 25.	· 설계용역 선정
2020. 06. 29.	· 사업시행계획인가
2021. 04. 28.	· 감정평가실시

□ 향후계획

- 2021. 1. : 보상 및 철거
- 2023. 1. : 착공
- 2025. 2. : 준공



관리번호	3-2-2	공약명	고성동 주택재건축사업				
추진부서	건축주택과 과장 신한중 / 주거정비팀장 성장경 / 주무관 조기성(☎665-2955)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ 사업목표

- 고성 주택재건축사업 완료

최종목표	연도	목 표
사업 완료	2018년	· 지하층 및 골조공사(30%)
	2019년	· 공사 추진(85%)
	2020년	· 준공(2020년 5월)

□ 사업개요

- 사업위치 : 고성동3가 5-139일원(고성광명아파트)
- 사업규모 : 아파트 9개동(682세대), 지하2층/지상29층, 연면적 102,726㎡
- 추진기간 : 2006년 6월 ~ 2020년 5월

□ 사업예산 : 해당없음(민간사업 추진)

□ 추진실적

일 자	추진내용
2006. 06. 28.	· 추진위원회 승인
2007. 01. 30.	· 정비구역 지정
2007. 04. 24.	· 조합설립 인가
2007. 08. 10.	· 사업계획시행 인가
2016. 08. 30.	· 관리처분계획 인가
2017. 09. 13.	· 착공
2017. 09. 14.	· 입주자모집공고 승인
2020. 05. 15.	· 준공

위치도



현장사진



관리번호	3-3	공약명	대전 화물자동차 공영차고지 조성사업				
추진부서	교통과 과장 서송학 / 교통시설팀장 정광수 / 주무관 손용우(☎665-3163) 운수관리팀장 최지영 / 주무관 김은정(☎665-3046)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	30			○			

□ 사업목표

- 영세 화물운송업자의 차고지 부족난 해소
- 지역 화물 물동량의 원활한 수송으로 물류경쟁력의 강화
- 도로 및 주거지역내 불법주차 완화로 쾌적한 주거환경 조성

최종목표	연도	목 표
화물자동차 공영차고지 조성	2018년	· 중기지방재정계획 반영 및 국비 확보
	2019년	· 관리계획 변경, 기본 및 실시계획 용역
	2020년	· GB관리계획 변경
	2021년	· 도시계획시설 결정 및 실시계획 인가고시 · 토지 보상
	2022년	· 공사 시행

□ 사업개요

- 위치/면적 : 태전동 43번지 일원 / 33,588㎡ 정도
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년)
- 주요시설 : 주차면 480면, 관리동, 자주식 철골 주차장 등
- 총사업비 : 410억원(국비 4, 시비 365, 구비 41)

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	30,000	21,000	6,000	3,000	-	11,777	400	10,215	1,162	-	303	170	49	84	-
현재	41,000	400	36,500	4,100	-										

※ 결산추경시 구비7억 편성 예정


□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 8.	· 국비(지역발전특별회계) 확보
2019. 4.	· 화물자동차 공영차고지 조성사업 관련 용역 착수
2019. 5. ~ 6.	· 국토교통부 실무협의(대구광역시↔국토교통부)
2019. 7.	· 대구시 입지대상시설 자체심사
2019. 8.	· 국토부 입지대상시설 중앙심사
2019. 9. ~ 10.	· 제4차 대구권 개발제한구역관리계획 2차 변경(안) 관련부서 협의 및 주민의견 청취(대구시)
2019. 11.	· 대구시 도시계획위원회 심의
2019. 12.	· 제4차 대구권 개발제한구역관리계획 2차 변경(안) 승인신청(대구광역시→국토교통부)
2020. 1. ~ 2.	· 중앙관계기관 협의(국토교통부↔국방부 외 6기관)
2020. 3.	· 낙산C구간 부체도로 사전협의(한국도로공사)
2020. 9.	· 제21회 중앙도시계획위원회 심의(GB관리계획 변경)
2020. 11.	· 제23회 중앙도시계획위원회 재심의(GB관리계획 변경) - 원안가결 · GB관리계획 변경 승인 통보
2020. 11. ~ 12.	· GB관리계획 변경 승인 열람공고
2021. 1. ~ 3.	· 도시계획시설 결정(안) 관련부서 협의
2021. 4. ~ 5.	· 도시관리계획(안) 열람공고
2021. 6.	· 대구광역시 도시계획위원회 심의(도시계획시설 결정) - 원안가결 · 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시

□ 향후계획

- 2021. 8. ~ 9. : 토지 등 물건 조사, 보상계획 공람·공고
- 2021. 9. ~ 10. : 토지 등 감정평가 실시
- 2021. 10. ~ 12. : 손실보상 협의, 실시계획 인가고시
- 2022. 1. ~ 9. : 국유지 소유권 이전, 수용 재결 진행 및 공탁
- 2022. 10. ~ : GB보전부담금 납부 및 공사 시행

○ 설계도

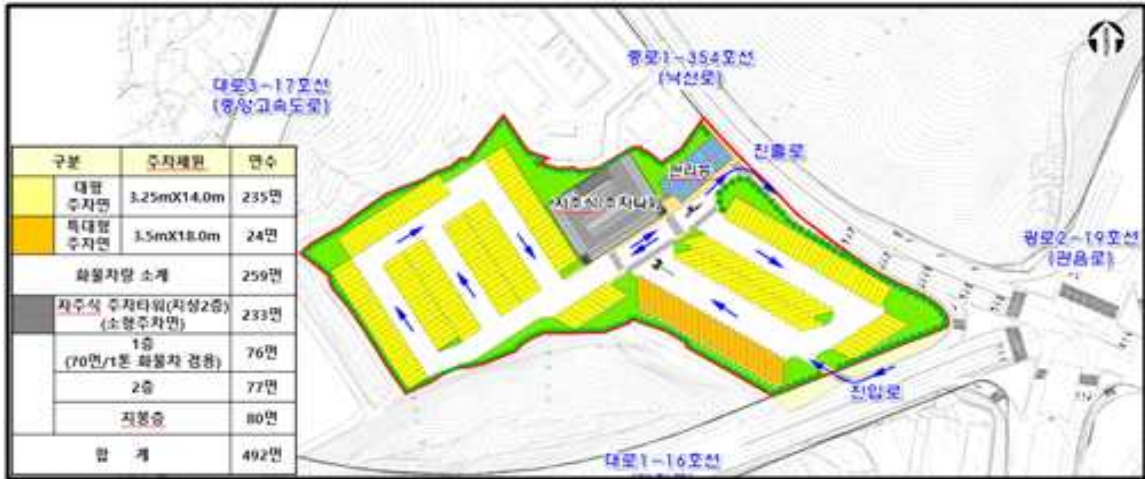

관리번호	3-4-1	공약명	사회 재난 선제적 대응체계 구축				
추진부서	안전총괄과 조창원 / 사회재난팀장 최성옥 / 주무관 신영환(☎665-2893)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ 사업목표

- 구 특성에 맞는 현장대응체계 표준 프레임 마련
- 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 보완
- 매뉴얼·가이드라인 교육 및 현장적용 시뮬레이션

최종목표	연도	목 표
재난현장 표준화 매뉴얼 및 가이드라인 제작 완료	2018년	· 재난현장 표준화 매뉴얼 및 가이드라인 제작 완료
	2019년	
	2020년	
	2021년	
	2022년	

□ 사업개요

- 근 거
 - 「재난 및 안전관리 기본법」 제34조의5(재난분야 위기관리 매뉴얼 작성·운영)
 - 재난현장 대응 표준화 시범사업을 위한 특별교부세 지원
- ※ 2017년 재난현장 대응 표준화 시범사업 대상자 선정(행정안전부)
- 기 간 : 2017. 10. ~ 2018. 11.
- 사 업 비 : 200,000천원(시 보조금 100%)
- 계약방법 : 조달의뢰(학술연구용역)

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	200	-	200	-	-	200	-	200	-	-	121	-	121	-	-
현재	200	-	200	-	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 05. 04.	· 재난현장 대응 표준화 시범사업 대상자 선정
2017. 10. 04.	· 재난현장 대응 표준화 시범사업 보조금 교부
2018. 02. 04.	· 일상감사 요청
2018. 02. 27.	· 계약심사 요청
2018. 03. 15.	· 용역입찰 의뢰
2018. 05. 21.	· 용역계약 → (주) 부린
2018. 05. 31.	· 연구용역 착수보고회 실시
2018. 07. 12.	· 현장 조치 매뉴얼 부서별 담당자 교육
2018. 10. 02.	· 연구용역 중간보고회
2018. 11. 30.	· 연구용역 최종보고회
2018. 11. 30.	· 현장조치 행동매뉴얼 제작 완료
2018. 12. 17.	· 행정안전부 현장조치 행동매뉴얼 우수사례 경진대회서 우수기관 선정

□ 향후계획

- 변화되는 환경에 맞춘 지속적인 현행화를 통해 현장적응성 유지

관리번호	3-4-2	공약명	자연재난 선제적 대응체계 구축				
추진부서	안전총괄과 조창원 / 자연재난팀장 방효석 / 주무관 김문학(☎665-4354)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 각종 자연 재난에 신속히 대응할 수 있도록 관련 매뉴얼을 현행화하고 정비
- 매년 폭염피해가 증가하는 추세로 이에 대비한 홍보 및 대응활동
- 최근 지진에 대한 주민들의 관심을 반영하여 지진 대응체계 구축

최종목표	연도	목 표
자연재난 선제적 대응체계 구축	2018년	· 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비(매년), · 폭염 대응 체계 구축(매년) · 지진 대응 체계 구축(내진성능평가, 지진대응패키지)
	2019년	· 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비(매년), · 폭염 대응 체계 구축(매년)
	2020년	· 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비(매년), · 폭염 대응 체계 구축(매년)
	2021년	· 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비(매년), · 폭염 대응 체계 구축(매년)
	2022년	· 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비(매년), · 폭염 대응 체계 구축(매년)

□ 사업개요

- 자연재난 표준행동 매뉴얼 정비 및 배부(매년)
 - 폭염 대응체계 구축(매년)
 - 폭염대책기간 : 매년 5월 ~ 9월
 - 그늘막(63개소)운영 및 관리, 재난도우미(299명)지정
 - 주요간선도로(50km)살수
 - 야외 무더위쉼터 운영(공원, 교량하부)
- ※ 코로나19 장기화에 따라 실내 무더위쉼터(133개소)는 임시 휴관

○ 지진 대응체계 구축(2019년~2021년)

- 2019년~2020년 : 공공시설물 내진성능평가(13개소)
- 2021년 : 공공시설물 3개소 보수보강공사 완료, 1개소 실시설계 완료

□ 사업예산(지진 대응체계 구축)

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,836	900		1,436		1,836	900		936		700	900		234	66
현재	1,836	900		936											

□ 추진실적

일 자	추진내용
2019. 5월	· 그늘막 구입 설치(6개소)
2019. 6월	· 자연재난 표준행동 매뉴얼 제작
2019. 6~9월	· 폭염대응 주요간선도로 살수차 임차용역
2019. 8월	· 찜질방 활용 무더위쉼터 운영(강북, 강남 각 1개소)
2019. 12월	· 공공시설물 2개소(칠곡시장, 창업보육센터) 내진성능평가 완료
2020. 1월	· 공공시설물 11개소(경로당) 내진성능평가 완료
2020. 5~6월	· 그늘막 구입 설치(13개소)
2020. 6월	· 자연재난 표준행동 매뉴얼 제작
2020. 6~9월	· 폭염대응 주요간선도로 살수차 임차용역
2020. 7~8월	· 그늘막 구입 설치(5개소)
2020. 8월	· 야외 무더위 쉼터 운영 및 양산 배부사업 시행
2021. 4월	· 무태교 보수보강공사 완료
2021. 5~6월	· 그늘막 구입 설치(7개소)
2021. 6월	· 하천출입차단기 징검다리 10개소 설치
2021. 6~9월	· 폭염대응 주요간선도로 살수차 임차용역
2021. 6월	· 침산2동 행정복지센터 외 1개소 내진보강 완료
2021. 6월	· 태전2동 행정복지센터 내진보강 실시설계 완료

□ 향후계획

- 폭염대책기간 중 신속한 장비 확보 및 인력동원
- 폭염 대비 양산 배부 및 대여사업(2021년)
- 그늘막 추가설치 및 하천출입차단기 추가설치
- 공공시설물 내진보강공사 지속 추진

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 코로나19 장기화로 인한 경로당 등 기존 실내 무더위쉼터 운영이 어려움
- 대책
 - 기존 무더위쉼터 임시 휴관 및 야외 무더위쉼터(공원, 교량 하부 등) 적극 운영

관리번호	3-5	공약명	교통약자 보행 환경 개선사업				
추진부서	교통과 과장 박천수 / 교통시설팀장 정광수 / 주무관 최승완(☎665-3161)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	80			○			

□ 사업목표

- 대각선 횡단보도 및 고원식 횡단보도 설치
- 생활권 이면도로 교통환경 개선
- 횡단보도 집중조명(투광기) 설치

최종목표	연도	목 표
교통약자 보행환경 개선	2018년	· 고원식 9개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 29개소
	2019년	· 고원식 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 5개소 (고원식 7개소, 집중조명 76개소 확대 시행)
	2020년	· 고원식 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 5개소 (집중조명 29개소 확대시행)
	2021년	· 고원식 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 5개소
	2022년	· 고원식 5개소, 생활권 이면도로 정비 1개지역, 집중조명 5개소

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 720백만원
- 사업내용
 - 대각선 횡단보도 설치 : 7개소
 - 고원식 횡단보도 설치 : 40개소
 - 생활권 이면도로 정비 : 5개 지역
 - 횡단보도 집중조명 설치 : 40개소

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	720	-	720	-	-	920	-	920	-	-	840	-	840	-	-
현재	920	-	920	-	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 7.	· 고원식 횡단보도 9개소 설치
2018. 8.	· 생활권 이면도로 정비 1개 지역 정비
2018. 9.	· 대각선 횡단보도 2개소 설치
2018. 12.	· 횡단보도 집중조명 29개소 설치
2019. 7.	· 횡단보도 집중조명 41개소 설치 · 대각선 횡단보도 1개소 설치
2019. 8.	· 고원식 횡단보도 7개소 설치
2019. 12.	· 횡단보도 집중조명 35개소 설치 · 대각선 횡단보도 2개소 설치
2020. 6.	· 횡단보도 집중조명 29개소 설치
2020. 7.	· 고원식 횡단보도 5개소 설치 시행
2021. 6.	· 고원식 횡단보도 3개소 설치 시행
2021. 7.	· 횡단보도 집중조명 13개소 설치 · 생활권 이면도로 정비 1개 지역

□ 향후계획

- 고원식 횡단보도 및 횡단보도 집중조명, 생활권 이면도로 정비 지속 추진
- 노후된 안전시설에 대한 유지보수 지속 추진
