

<b>관리번호</b>	<b>3-2-2</b>	<b>공약명</b>	<b>고성동 주택재건축사업</b>				
<b>추진부서</b>	건축주택과 과장 신한중 / 주거정비팀장 성장경 (☎665-2953)						
<b>추진상황</b>	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	<b>100</b>	○					

**□ 사업목표**

- 고성 주택재건축사업 완료

최종목표	연도	목 표
사업 완료	2018년	· 지하층 및 골조공사(30%)
	2019년	· 공사 추진(85%)
	2020년	· 준공(2020년 5월)

**□ 사업개요**


- 사업위치 : 고성동3가 5-139일원(고성광명아파트)
- 사업규모 : 아파트 9개동(682세대), 지하2층/지상29층, 연면적 102,726㎡
- 추진기간 : 2006년 6월 ~ 2020년 5월

**□ 사업예산 : 해당없음(민간사업 추진)**

**□ 추진실적**

일 자	추 진 내 용
2006. 6. 28.	· 추진위원회 승인
2007. 1. 30.	· 정비구역 지정
2007. 4. 24.	· 조합설립 인가
2007. 8. 10.	· 사업계획시행 인가
2016. 8. 30.	· 관리처분계획 인가
2017. 9. 13.	· 착공
2017. 9. 14.	· 입주자모집공고 승인
2020. 5. 15.	· 준공

## 위치도

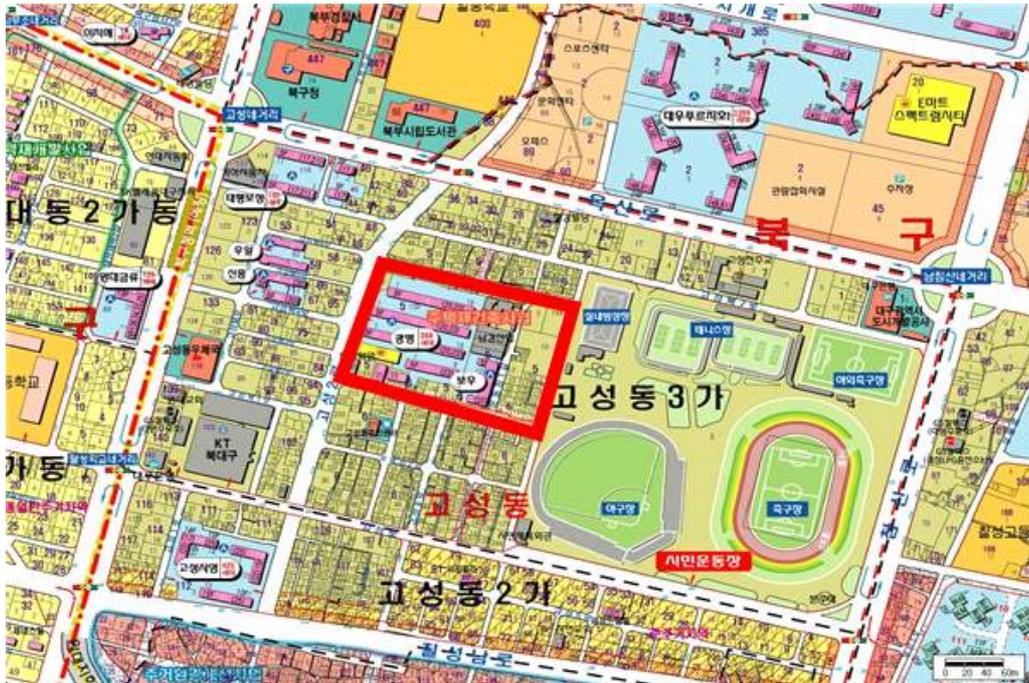

## 현장사진

